My Team | Budi_od_hajra_Raspored_aktivnosti

	Task name	Start date	End date	Duration	Time log	Progress
		25/10/2021	**11/01/2022**	**456h**	**0**	**0%**
1	**Expected results**	**25/10/2021**	**10/01/2022**	**448h**	**0**	**0%**
1.1	Start of the project	25/10/2021	25/10/2021	8h	0	0%
1.2	Vision system	01/11/2021	01/11/2021	8h	0	0%
1.3	Request document	15/11/2021	15/11/2021	8h	0	0%
1.4	An architectural protot…	18/11/2021	18/11/2021	8h	0	0%
1.5	Prototype user interface	22/11/2021	22/11/2021	8h	0	0%
1.6	Architectural project	29/11/2021	29/11/2021	8h	0	0%
1.7	Detailed project	13/12/2021	13/12/2021	8h	0	0%
1.8	Beta version	16/12/2021	16/12/2021	8h	0	0%
1.9	Testing plan	20/12/2021	20/12/2021	8h	0	0%
1.10	Test report	27/12/2021	27/12/2021	8h	0	0%
1.11	The final version	27/12/2021	27/12/2021	8h	0	0%
1.12	User guide	07/01/2022	07/01/2022	8h	0	0%
1.13	Product presentation	10/01/2022	10/01/2022	8h	0	0%
2	**Project planning phase**	**25/10/2021**	**08/11/2021**	**88h**	**0**	**0%**
2.1	**Preliminary iteration**	**25/10/2021**	**08/11/2021**	**88h**	**0**	**0%**
2.1.1	Defining requirements	25/10/2021	01/11/2021	48h	0	0%
2.1.2	Creating a vision of …	28/10/2021	04/11/2021	48h	0	0%
2.1.3	Domain modeling	01/11/2021	01/11/2021	8h	0	0%
2.1.4	Use case analysis	02/11/2021	08/11/2021	40h	0	0%
3	**Project development ph…**	**08/11/2021**	**29/11/2021**	**128h**	**0**	**0%**
3.1	**Iteration R1 - develo…**	**08/11/2021**	**29/11/2021**	**128h**	**0**	**0%**
3.1.1	Preparation of a do…	08/11/2021	15/11/2021	48h	0	0%
3.1.2	Implementation of a…	08/11/2021	17/11/2021	64h	0	0%
3.1.3	Architecture testing	18/11/2021	18/11/2021	8h	0	0%
3.1.4	Implementation of a…	19/11/2021	22/11/2021	16h	0	0%
3.1.5	Development of an …	22/11/2021	29/11/2021	48h	0	0%
4	**Project development ph…**	**29/11/2021**	**27/12/2021**	**168h**	**0**	**0%**
4.1	**Iteration I1 - develop…**	**29/11/2021**	**21/12/2021**	**136h**	**0**	**0%**
4.1.1	Creating a detailed …	29/11/2021	13/12/2021	88h	0	0%
4.1.2	Beta implementation	29/11/2021	16/12/2021	112h	0	0%
4.1.3	Creating a testing pl…	16/12/2021	20/12/2021	24h	0	0%
4.1.4	System testing	20/12/2021	21/12/2021	16h	0	0%
4.1.5	Preparation of test r…	20/12/2021	21/12/2021	16h	0	0%
4.2	**Iteration I2 - develop…**	**22/12/2021**	**27/12/2021**	**32h**	**0**	**0%**
4.2.1	Implementation of t…	22/12/2021	24/12/2021	24h	0	0%
4.2.2	Testing the final ver…	27/12/2021	27/12/2021	8h	0	0%
4.2.3	Update test report	27/12/2021	27/12/2021	8h	0	0%
5	**Project completion phase**	**28/12/2021**	**11/01/2022**	**88h**	**0**	**0%**
5.1	**Iteration O1 - system…**	**28/12/2021**	**11/01/2022**	**88h**	**0**	**0%**
5.1.1	Arranging project d…	28/12/2021	03/01/2022	40h	0	0%
5.1.2	Creating user manual	04/01/2022	10/01/2022	40h	0	0%
5.1.3	System installation	11/01/2022	11/01/2022	8h	0	0%

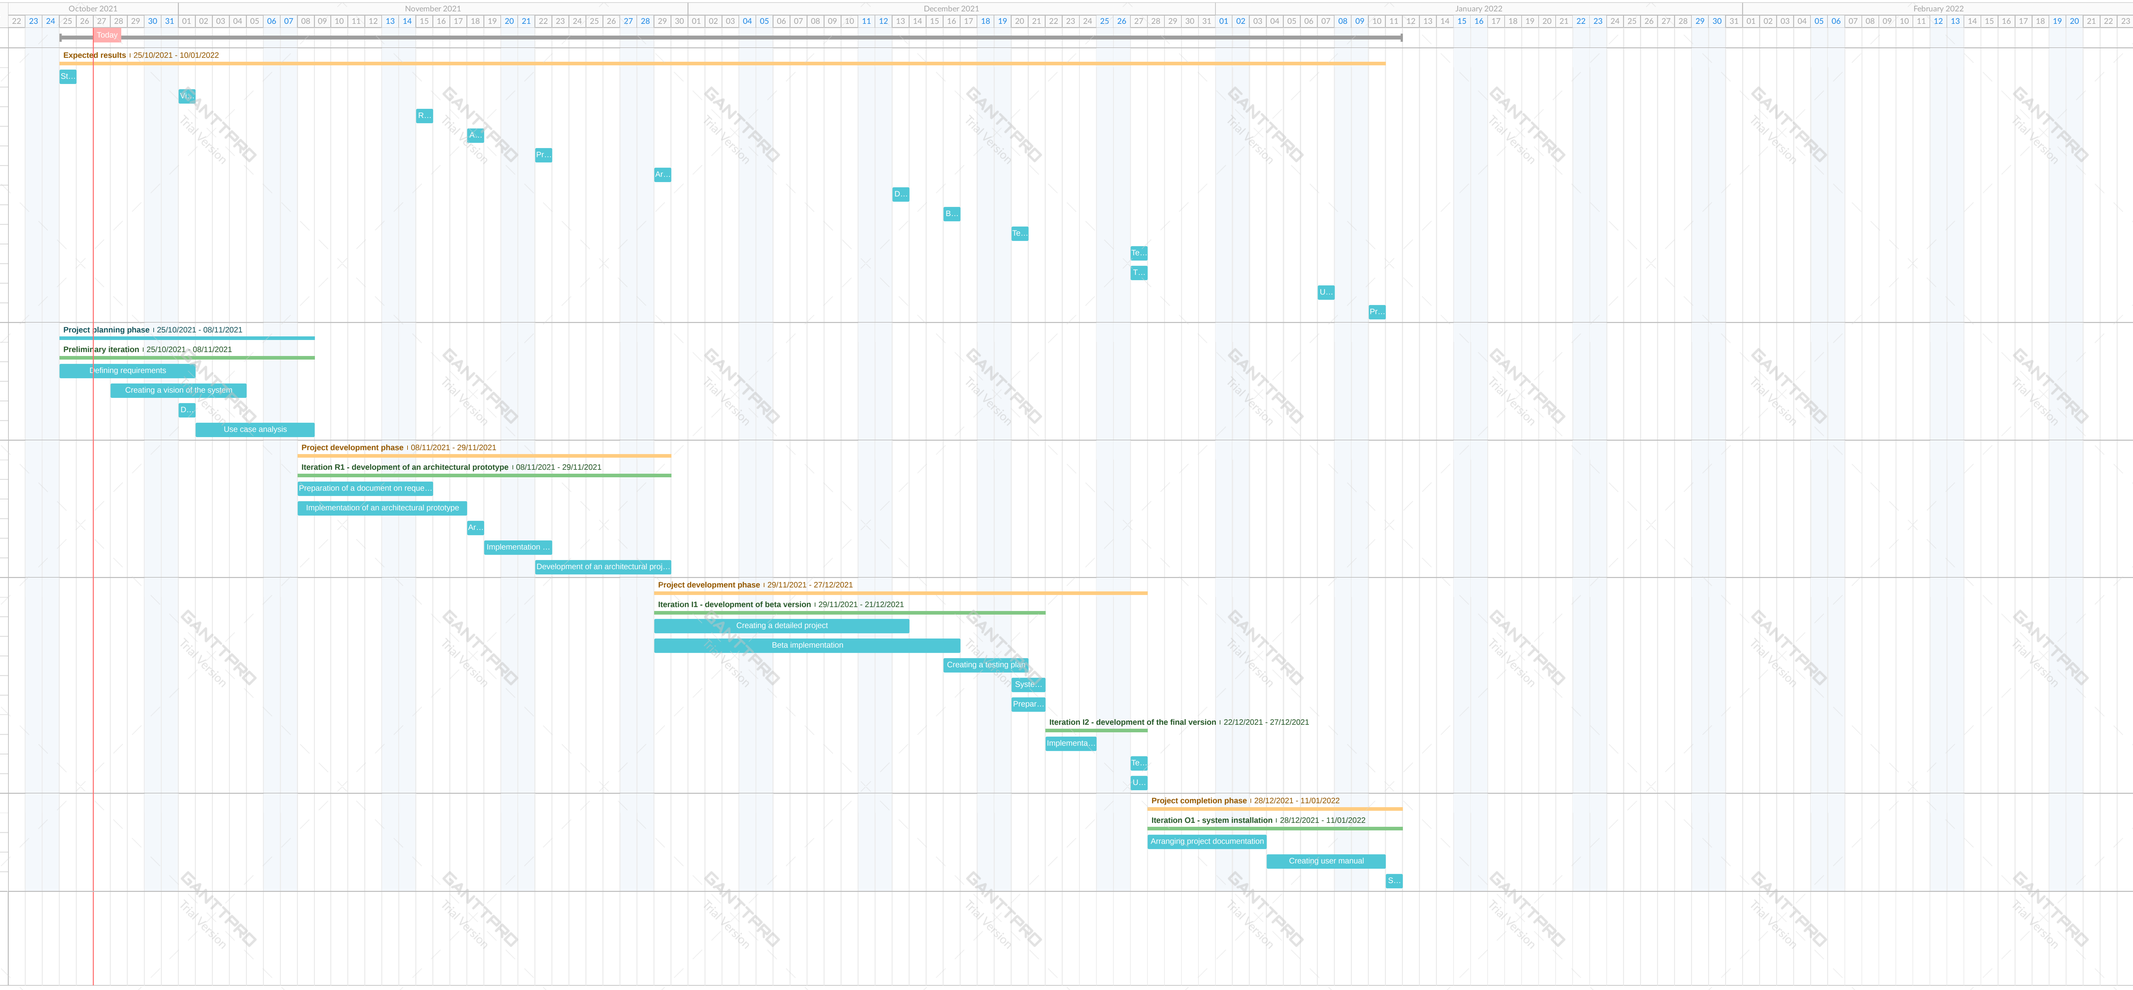

Workload

Hours Tasks

Anida Fakić
